




Kleiderschrank Max Musternamm

1 Möbel · Ansicht schräg von oben

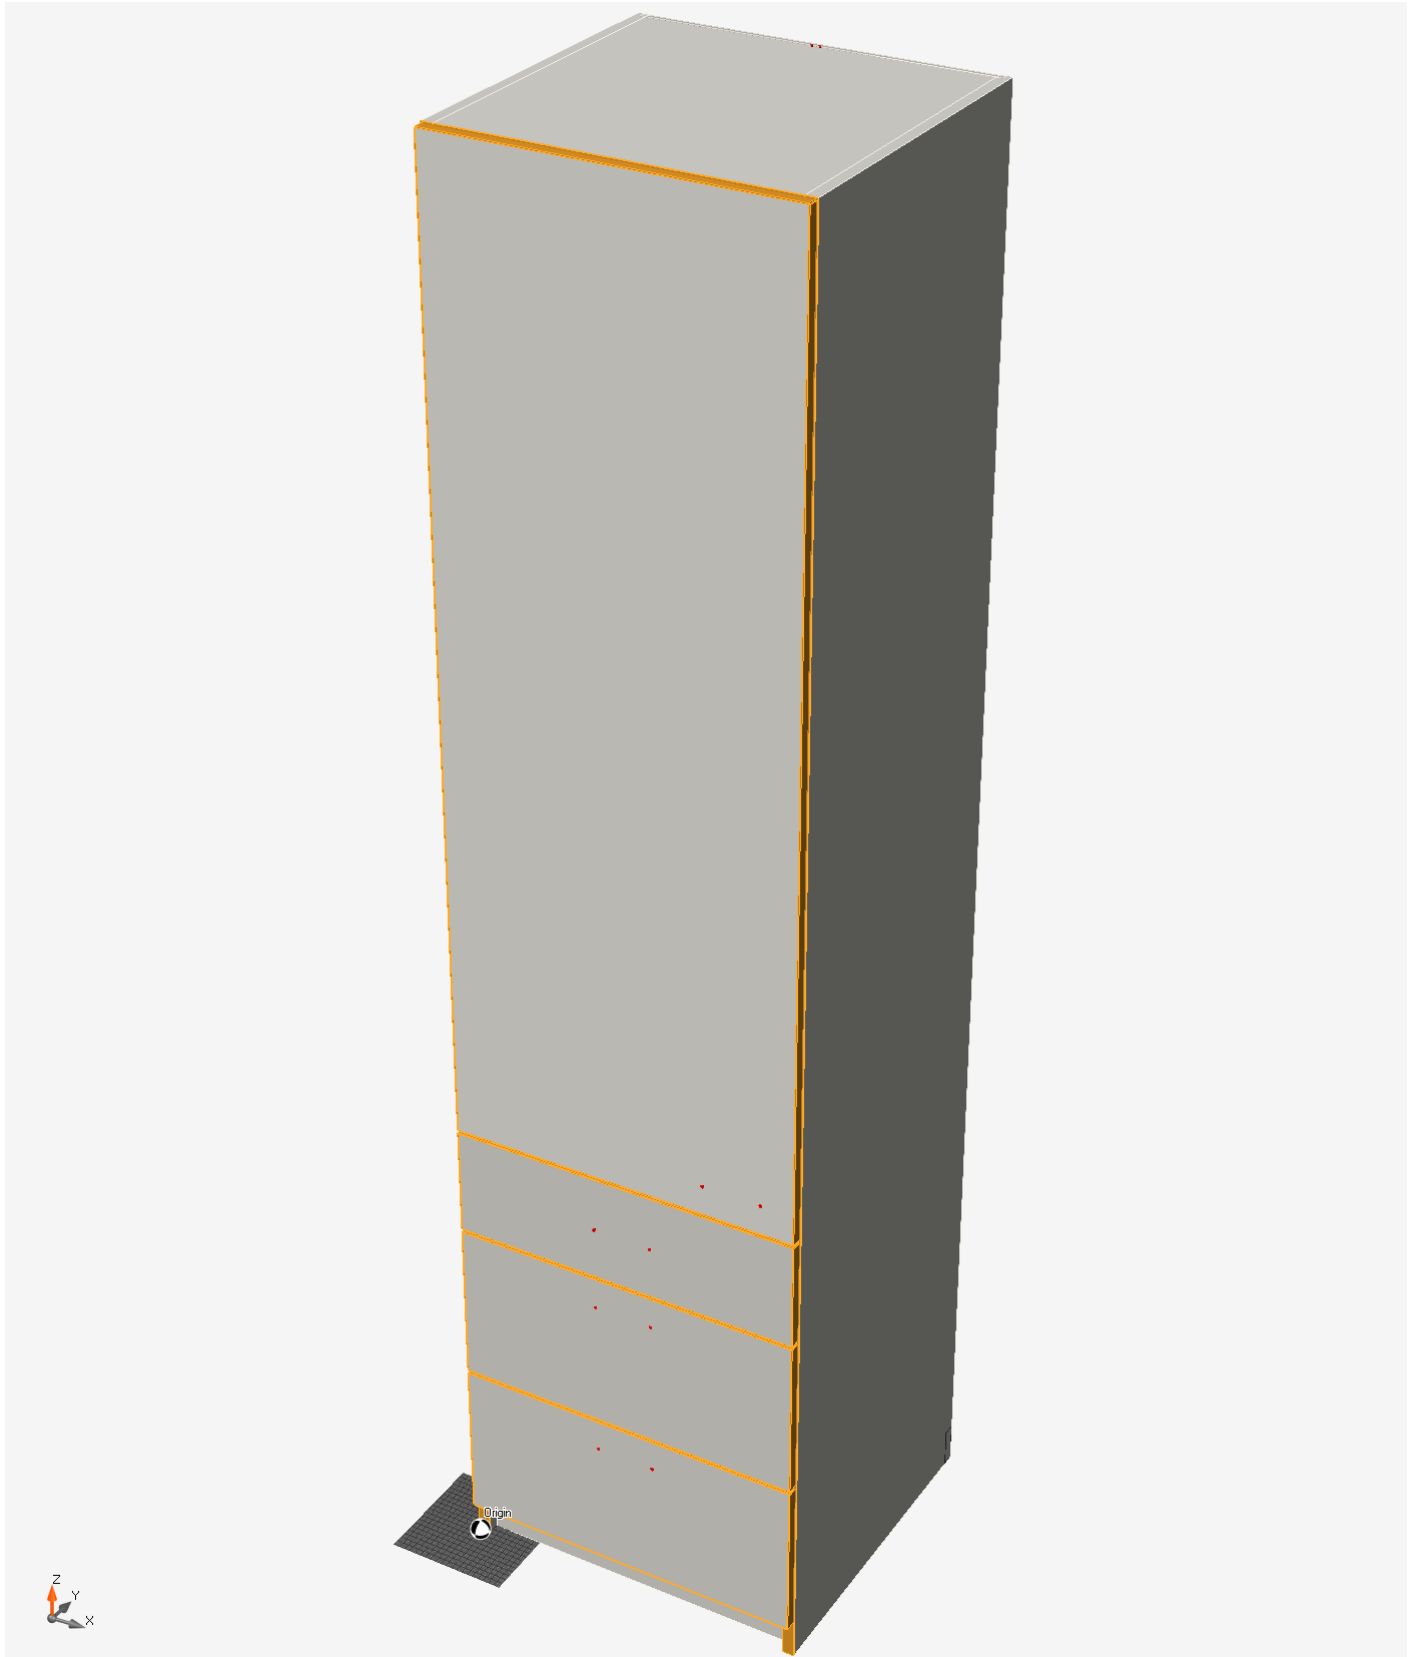


Oliver Fendt

Wartaweil 32, 82211 Herrsching
cabinetto@bbasic.de




Draufsicht · ganzes Projekt

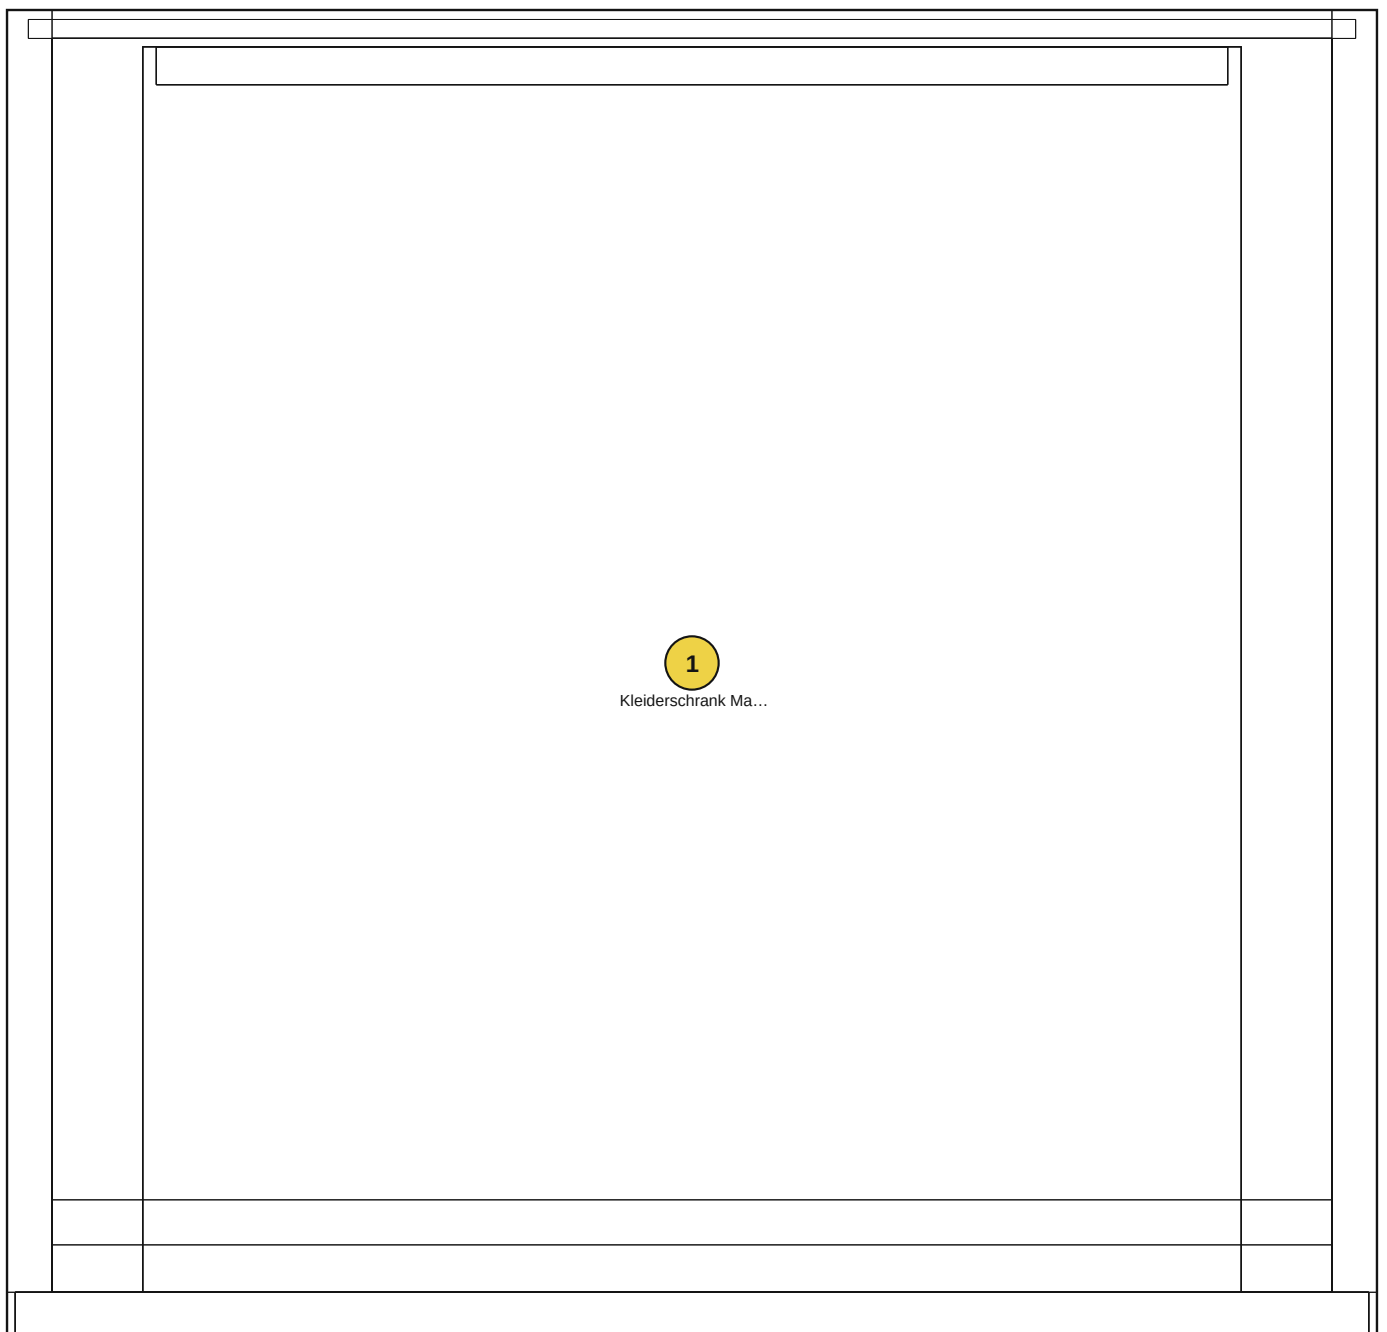



Frontansicht · Winkel 0° (1 Möbel)

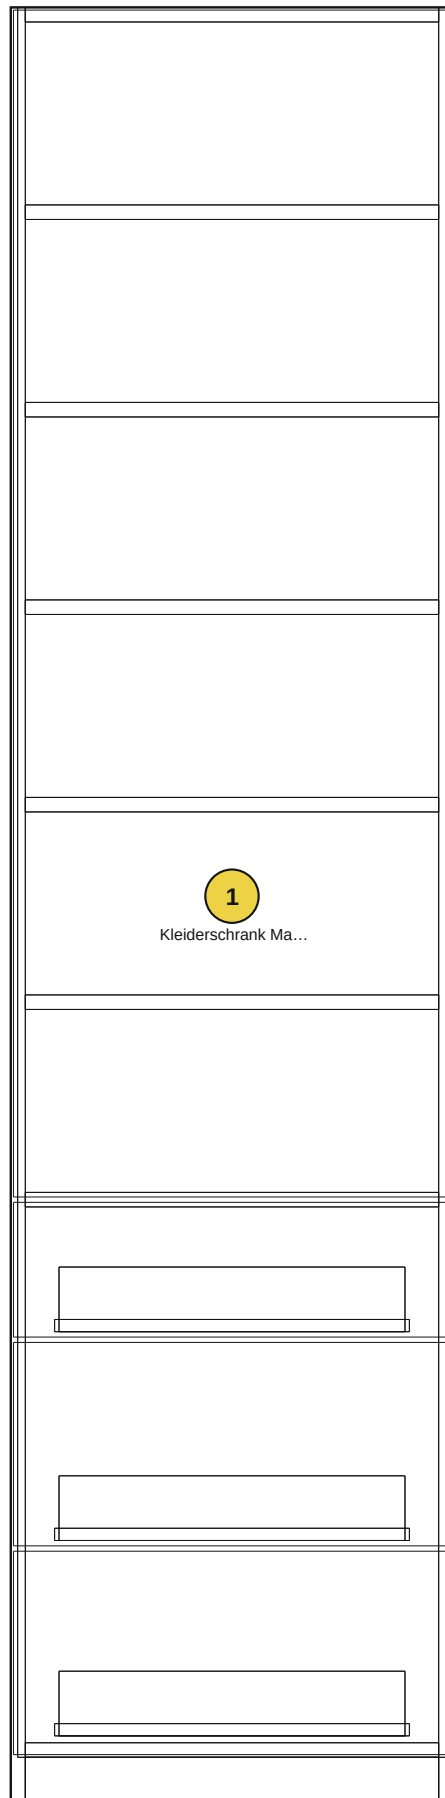



Zuschnittsliste

Modell Kleiderschrank Max Musternamm · Nr. 1

brutto = Fertigmaß inkl. Kante, netto = Rohplatte ohne Kante

ZEG Weiss 101 SM 19mm

Nr	Art	H brutto	B brutto	H netto	B netto	D	Stk	Kanten
1	Deckel	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
2	Boden	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
3	Seite links	2350,00	541,00	2350,00	539,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
4	Seite rechts	2350,00	541,00	2350,00	539,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
5	Fixed Shelf	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
6	Mobiler Boden 5mm Loe...	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
7	Mobiler Boden 5mm Loe...	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
8	Mobiler Boden 5mm Loe...	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
9	Mobiler Boden 5mm Loe...	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
10	Mobiler Boden 5mm Loe...	529,00	540,00	527,00	540,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm
11	Sockel vorne	64,00	540,00	64,00	540,00	19,00	1	
12	Tür Scharnier TH Hett...	1550,50	571,00	1546,50	567,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm H...
13	Architech 94/550	265,75	571,00	261,75	567,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm H...
14	Architech 94/550	265,75	571,00	261,75	567,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm H...
15	Architech 94/550	176,00	571,00	172,00	567,00	19,00	1	V: Kante ABS 2mm H...

ZEG Schubladen Grau 16mm

Nr	Art	H brutto	B brutto	H netto	B netto	D	Stk	Kanten
16	Architech 94/550 Boden	525,50	463,50	525,50	463,50	16,00	1	
17	Architech 94/550 Boden	525,50	463,50	525,50	463,50	16,00	1	
18	Architech 94/550 Boden	525,50	463,50	525,50	463,50	16,00	1	
19	Architech 94/550 Rück...	84,50	452,00	84,50	452,00	16,00	1	
20	Architech 94/550 Rück...	84,50	452,00	84,50	452,00	16,00	1	
21	Architech 94/550 Rück...	84,50	452,00	84,50	452,00	16,00	1	

ZEG weiss 8mm

Nr	Art	H brutto	B brutto	H netto	B netto	D	Stk	Kanten
22	Rückwand	2286,00	560,00	2286,00	560,00	8,00	1	

Ausfräsungen (am Panel)

Platte	Form	B / Ø	H / r	Anker	Tiefe
Seite	Rechteck	20,00	64,00	Max/Min p Max/Min	durchgehend
Seite	Rechteck	20,00	64,00	Max/Min p Max/Min	durchgehend

Verbindungen (Fugentabelle)

Platte	Platte	Anz.	Verbindung	Regel
Linke Seite	Rückwand	1	Schraube_Rückwand3mm/5mmtief	Schraubloch_Alle30cm
Linke Seite	Deckel	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3_oben	Mafel DoppelDübel10
Linke Seite	Boden	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3	Mafel DoppelDübel10
Linke Seite	Vertikale Trennwa...	1	Oli_MafelDoppelDübel8	Mafel DoppelDübel10
Rechte Seite	Rückwand	1	Schraube_Rückwand3mm/5mmtief	Schraubloch_Alle30cm
Rechte Seite	Deckel	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3_oben	Mafel DoppelDübel10
Rechte Seite	Boden	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3	Mafel DoppelDübel10
Rechte Seite	Vertikale Trennwa...	1	Oli_MafelDoppelDübel8	Mafel DoppelDübel10
Rückwand	Deckel	1	Schraube_Vorgebohrt3mm/5mmt...	Schraubloch_Alle30cm
Rückwand	Deckel	1	Markierung Rückwand Oben	Mittenmarkierung



Platte	Platte	Anz.	Verbindung	Regel
Rückwand	Boden	1	Schraube_Vorgebohrt3mm/5mmt...	Schraubloch_Alle30cm
Rückwand	Boden	1	Markierung Rückwand unten	Mittenmarkierung
Boden	Vertikale Trennwa...	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3	Mafel DoppelDübel10
Linke Seite	—	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3	Mafel DoppelDübel10
Rechte Seite	—	1	Oli_MafelDoppelDübel8x3	Mafel DoppelDübel10
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	Mittenmarkierung
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	
—	Linke Seite	1	Hettich Architec	Einzeln
—	Linke Seite	1	Hettich Architec	Einzeln
—	Linke Seite	1	Hettich Architec	Einzeln
Linke Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rechte Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	Mittenmarkierung
Linke Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rechte Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	Mittenmarkierung
Linke Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rechte Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	Mittenmarkierung
Linke Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rechte Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	Mittenmarkierung
Linke Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rechte Seite	—	1	Oli_Regal_Mobil	LochreiheOliver
Rückwand	—	1	Markierung Rückwand Boden f...	Mittenmarkierung
—	Linke Seite	1	Oli_Scharnier_TH Intermat	OliTür
—	Linke Seite	1	Oli_Scharnier_Vorbereitung	OliTür
—	Linke Seite	1	Oli_DoppelTuergriffVorberei...	
—	Linke Seite	1	OliverTüren	
—	Linke Seite	1	OliverHettich Scharniere	

Kalkulationsbericht – Material

— Platte —

Platte	EAN	Menge Einh.	Preis / Einh.	Preis
ZEG Weiss 101 SM 19mm, 19 (+40 % Verschnitt)	5555	6,15 m²	8,40 €	51,68 €
ZEG Schubladen Grau 16mm, 16 (+120 % Verschnitt)	P0002159	0,85 m²	33,00 €	27,89 €
ZEG weiss 8mm, 8 (+50 % Verschnitt)	P40410	1,28 m²	9,00 €	11,52 €
Gesamt				91,09 €

— Kante —

Kante	EAN	Menge Einh.	Preis / Einh.	Preis
Kante ABS 2mm		18,02 m	1,40 €	25,22 €
Gesamt				25,22 €

— Zubehör (Beschläge) —

Zubehör (Beschläge)	EAN	Menge Einh.	Preis / Einh.	Preis
Schraube_Rückwand3mm/5mmtief	E9532221	18 Stk	0,02 €	0,36 €
Oli_MafelDoppelDübel8x3_oben		4 Stk	1,00 €	4,00 €
Oli_MafelDoppelDübel8x3		10 Stk	1,00 €	10,00 €
Oli_MafelDoppelDübel8		4 Stk	0,00 €	0,00 €
Schraube_Vorgebohrt3mm/5mmtief		6 Stk	0,00 €	0,00 €



Zubehör (Beschläge)	EAN	Menge	Einh.	Preis / Einh.	Preis
Markierung Rückwand Boden fix		1	Stk	0,00 €	0,00 €
Hettich Architec		1	Stk	22,00 €	22,00 €
Architech 94/550		3	Stk	20,00 €	60,00 €
Gesamt					96,36 €

Material gesamt **212,67 €**

Kalkulationsbericht – Werkstatt

— Werkstatt / Bearbeitung —

Werkstatt / Bearbeitung	EAN	Menge	Einh.	Preis / Einh.	Preis
Holz Werkstatt: ZEG Schubladen Grau 16mm	P0002159	0,85	m²	8,80 €	7,44 €
Holz Werkstatt: ZEG weiss 8mm	P40410	1,28	m²	2,25 €	2,88 €
Schraube_Rückwand3mm/5mmtief	E9532221	18	Stk	0,30 €	5,40 €
Oli_MafelDoppelDübel8x3_oben		4	Stk	0,50 €	2,00 €
Oli_MafelDoppelDübel8x3		10	Stk	0,50 €	5,00 €
Oli_MafelDoppelDübel8		4	Stk	0,50 €	2,00 €
Schraube_Vorgebohrt3mm/5mmtief		6	Stk	0,50 €	3,00 €
Markierung Rückwand Boden fix		1	Stk	0,20 €	0,20 €
Hettich Architec		1	Stk	2,50 €	2,50 €
Architech 94/550		3	Stk	15,00 €	45,00 €
Nut		4,62	m	0,10 €	0,46 €
Lochreihe		388	Stk	0,05 €	19,40 €
Ausfräsung		0,34	m	0,20 €	0,07 €
Einrichtung		1	Stk	20,00 €	20,00 €
Holzwechsel		3	Stk	10,00 €	30,00 €
Gesamt					145,35 €

Werkstatt gesamt **145,35 €**

Gesamtsumme **358,02 €**
